

Voortgangsrapportage uitvoering Regioplan IZA Midden-Brabant januari – juni 2025

3 september 2025



Inhoudsopgave


Leeswijzer

Hoofdstuk 1 Voortgang per prioritaire opgave

Hoofdstuk 2 Voortgang per integrale oplossingsrichting


Hoofdstuk 3, 4, 5 Voortgang op overkoepelende thema's

Legende

 = on track

 = vertraagd

 = niet behaald

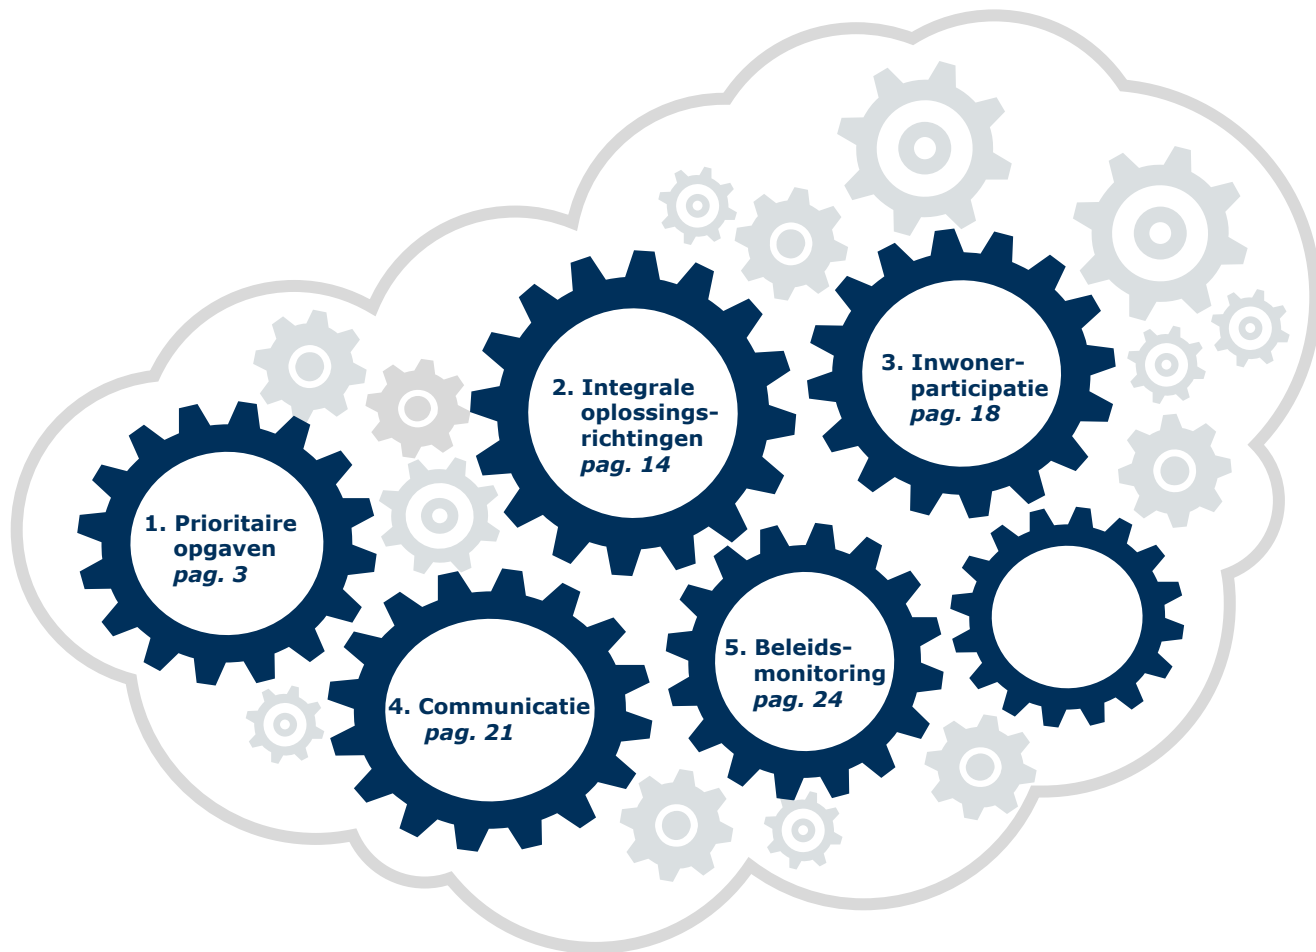



Hoofdstuk 1
Prioritaire opgaven

1. Prioritaire opgave - Leefstijl en leefomgeving (1^e halfjaar 2025)

Eind Q4 is het aanbod gedaan om een programmamanager aan te stellen om het proces van de prioritaire opgave te faciliteren. Deze is in Q2 van 2025 gestart.

	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025
1 Grotere kansen op een betere leefstijl (CdT en GGD HvB)	- Opstellen van een tactisch plan van aanpak - Starten met de uitvoering	- Uitvoeren - Monitoren - Evalueren activiteiten - Opstellen borgingsplan	- Wergroep opstarten - Gesprekken starten richting planvorming - Verhouding ontwikkelingen reg. Nota publieke gezondheid tot deze opgave - Inwoners zijn actief betrokken - Lopende en kansrijke initiatieven verbinden aan opgave	- Programmamanager L&L is gestart - Verdere planvorming - Zicht krijgen op de uitvoering - Inwoners zijn actief betrokken - Lopende en kansrijke initiatieven verbinden aan opgave, waaronder OKO, Skip the Trip en Beweegcoach ETZ
2 Versterking sociale leefomgeving (CdT en GGD HvB)	- Verbinden van beweging van onderop (er zijn al veel initiatieven) met die van bovenaf (strategisch beleid) - Versterken van initiatieven vanuit de noodzakelijke mix van beleid+uitvoering en zorg+welzijn)		- Wergroep opstarten - Gesprekken starten richting planvorming - Inwoners zijn actief betrokken	- Programmamanager L&L is gestart - Verdere planvorming - Zicht krijgen op de uitvoering - Inwoners zijn actief betrokken
3 Verbetering fysieke leefomgeving (CdT en GGD HvB)	- Opstellen van een plan van aanpak - Starten met de uitvoering	Project governance: opstellen van een monitorings- en evaluatieplan	- Wergroep opstarten - Gesprekken starten richting planvorming - Inwoners zijn actief betrokken	- Programmamanager L&L is gestart - Verdere planvorming - Zicht krijgen op de uitvoering - Inwoners zijn actief betrokken

4 Zorgzame en gezonde buurten -> zie hoofdstuk 2 (integrale oplossingsrichting)

1. Prioritaire opgave - Leefstijl en leefomgeving (2^e halfjaar 2025)

	Q3 2025	Q4 2025
1 Grotere kansen op een betere leefstijl (CdT en GGD HvB)	• Officiële start en aftrap werkgroepen (6-10) • Strategie inwonerparticipatie op beleidsniveau is bekend • Kaders voor beleidsmonitoring staan • Rol kartrekkersgroep (governance werkgroep) is uitgewerkt	• Inwoners zijn actief betrokken, op beleidsniveau • Strategie inwonersparticipatie op projectniveau is bekend • Verdere mijlpalen Q4 in de loop van Q3 bepalen
2 Versterking sociale leefomgeving (CdT en GGD HvB)	• Officiële start en aftrap werkgroepen (6-10) • Strategie inwonerparticipatie is bekend • Kaders voor beleidsmonitoring staan • Rol kartrekkersgroep (governance werkgroep) is uitgewerkt	• Inwoners zijn actief betrokken, op beleidsniveau • Strategie inwonersparticipatie op projectniveau is bekend • Verdere mijlpalen Q4 in de loop van Q3 bepalen
3 Verbetering fysieke leefomgeving (CdT en GGD HvB)	• Officiële start en aftrap werkgroepen (6-10) • Strategie inwonerparticipatie is bekend • Kaders voor beleidsmonitoring staan • Rol kartrekkersgroep (governance werkgroep) is uitgewerkt	• Inwoners zijn actief betrokken, op beleidsniveau • Strategie inwonersparticipatie op projectniveau is bekend • Verdere mijlpalen Q4 in de loop van Q3 bepalen

4 Zorgzame en gezonde buurten -> zie hoofdstuk 2 (integrale oplossingsrichting)

1. Prioritaire opgave - Gezond en veilig opgroeien (1^e halfjaar 2025)

Het eerste halfjaar heeft voor de regionale ketenaanpak Kansrijke start in het teken gestaan van het vaststellen van een gezamenlijk visie. Men is voortvarend aan de slag gegaan met regionale deskundigheidsbevordering door het opzetten van een regiotour. De Zorgpadentool is gevuld, wat ondersteuning gaat bieden aan de ketensamenwerking. Daarnaast is er volop energie voelbaar op de samenwerking met ervaringsdeskundigen, wat geresulteerd heeft in een cofinanciering van FNO "gezinnen aan zet" voor "Samen, het netwerk voor en door ervaringsdeskundigen".

Wat betreft onze jeugd is mentaal weerbaar en gezond heeft Q2 volledig in het teken gestaan van de werving van een projectleider. Hiervoor hebben meerdere partijen zich ingezet om geschikte kandidaat te leveren, en gelukkig is deze recent ook gevonden. Opdrachtgeverschap wordt gezamenlijk opgepakt door de gemeente en de GGD.

OKO is overgeheveld naar andere prioritaire opgave. Kind naar Gezond Gewicht loopt, echter zijn er ook zorgen rondom de duurzame financiering.

	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025
1 Een kansrijke start voor ieder kind	- Opstellen begroting 2025 - Uitvoering volgens toegekende aanvullende financiering ketenaanpak - Aanvullende financiering voortzetting MamaKits met IZA-middelen 2024	- Uitvoering volgens toegekende aanvullende financiering ketenaanpak - Deel van proces on hold door situatie VNG (o.a. goedkeuren begroting '25) - Aanvullende financiering voortzetting MamaKits met IZA-middelen 2024	- Definitief besluit op begroting 2025 - Beschikkingen verstrekken door mandaatgemeente - Uitvoeringsagenda opstellen - Opstarten uitvoering - Inwoners zijn actief betrokken	- Verkennde gesprekken monitoring - Visie vastgesteld - Deskundigheidsbevordering regionaal opgestart - Impuls samenwerking dmv oplevering zorgpadentool - Scenario's financiering soc.-med. MDO Zwangeren - LinkedIn pagina is actief - Inwoners zijn actief betrokken - Helderheid over 2026 e.v. met oog op AZWA
2 Onze jeugd is mentaal weerbaar, gezond en veerkrachtig	- Opstellen begroting - Meerdere voorstellen herschreven - Vragen om go or no go	- Situatie VNG waardoor proces on hold - Opstellen uitvoeringsplan	- Definitief besluit op begroting 2025 - Beschikkingen verstrekken door mandaatgemeente - Aanstellen projectleider - Uitvoeringsagenda opstellen - Opstarten uitvoering - Inwoners zijn actief betrokken	- Verkennde gesprekken monitoring - Helderheid over 2026 e.v. met oog op AZWA - Werving projectleider - Inwoners zijn actief betrokken
3 Bevorderen van de leefstijl van jongeren en kinderen	- Opstellen begroting - Meerdere voorstellen herschreven - Vragen om go or no go	- Situatie VNG waardoor proces on hold - Opstellen uitvoeringsplan	- Definitief besluit op begroting 2025 - Uitvoeringsagenda opstellen - Opstarten uitvoering - Aanstellen projectleider OKO* - Beschikkingen verstrekken door mandaatgemeente - Inwoners zijn actief betrokken	- Uitvoering Kind naar Gezond Gewicht loopt in merendeel van gemeenten - Inwoners zijn actief betrokken m.n. op landelijk niveau d.m.v. bijdrage ervaringsonderzoek - Verkennde gesprekken monitoring - Financiering afhankelijk van eigenaarschap landelijk gesignaleerde knelpunten - Helderheid over 2026 e.v. met oog op AZWA

1. Prioritaire opgave - Gezond en veilig opgroeien (2^e halfjaar 2025)

Het tweede halfjaar is deels afhankelijk van besluitvorming over financiering. Dit geldt zowel voor de inzet van overbruggingsfinanciering voor de sociaal-medische MDO's zwangeren, als voor de beschikbare middelen in 2026 voor het voortzetten van het uitvoeringsplan voor onze jeugd mentaal weerbaar en gezond én de voortgang van Kind naar Gezond Gewicht. Deze laatste is mede afhankelijk van het eigenaarschap dat landelijk moet worden opgepakt voor gesignaleerde knelpunten.

	Q3 2025	Q4 2025
1 Een kansrijke start voor ieder kind	- Helderheid over 2026 e.v. met oog op AZWA - Beslissing over overbruggingsfinanciering soc.-med. MDO Zwangeren is genomen - Invulling monitoren verder vormgeven - Implementatie zorgpadentool - Inwoners zijn actief betrokken	- Kick-off Zorgpadentool (in de week van 20-10) - Eerste regiotoeur deskundigheidsbevordering is afgerond - Borgingsplan Kansrijke Start 2026 - Inwoners zijn actief betrokken
2 Onze jeugd is mentaal weerbaar, gezond en veerkrachtig	- Beschikkingen verstrekken door mandaatgemeente - Helderheid over 2026 e.v. met oog op AZWA - Start projectleider - Uitvoeringsagenda opstellen - Opstarten uitvoering - Invulling monitoren vormgeven - Inwoners zijn actief betrokken	- Invulling mijlpalen Q4 afhankelijk van besluitvorming in Q3 - Inwoners zijn actief betrokken
3 Bevorderen van de leefstijl van jongeren en kinderen	- Helderheid over 2026 e.v. met oog op AZWA - Uitsluitel over eigenaarschap landelijk gesignaleerde knelpunten - Uitsluitel over financiering gemeenten en ZVW - Invulling monitoren vormgeven - Inwoners zijn actief betrokken	- Invulling mijlpalen Q4 afhankelijk van besluitvorming in Q3 - Inwoners zijn actief betrokken

Het belang van een brede aanpak en persoonlijk contact

Ervaringen van kinderen en gezinnen met de aanpak
Kind naar Gezonder Gewicht



1. Prioritaire opgave - Mentale gezondheid (1^e halfjaar 2025)

De oorspronkelijke opdracht voor de uitwerking laagdrempelige inloopvoorzieningen is herzien, mede naar aanleiding van het ontbreken van specifieke financiering vanuit het TP. De belangrijkste stakeholders werken de nieuwe opdracht nu uit, waarbij samenwerking vanuit bestaande voorzieningen centraal staat.

	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025
1 Preventie en het versterken van de sociale basis (<i>Gemeente, GGD HvB, GGZ Breburg</i>)	Suicidepreventie: scope en trekkende partij	Suicidepreventie: projectplan opstellen	- Suicidepreventie: start projectleider, start uitvoering - Inwoners zijn actief betrokken	- Verdere implementatie van Supranet Community op regionaal niveau, met aanhaking van alle relevante stakeholders - Implementatie is gestart - Inwoners zijn actief betrokken
2 Wijkgerichte GGZ (<i>Gemeente, RIBW, GGZ Breburg</i>)	Bepaling scope en trekkende partij	- Integraal projectplan laagdrempelige steunpunten opstellen - Keuzes maken omtrent financiering	- Integraal projectplan laagdrempelige steunpunten opstellen - Keuzes maken omtrent financiering - Inwoners zijn actief betrokken	- Herijking van de oorspronkelijke opdracht - Uitvoeren nieuwe verkenning door belangrijkste stakeholders Start uitvoering - Inwoners zijn actief betrokken
3 Mentaal gezondheidsnetwerk (<i>GGZ Breburg, PrimaCura, Zorgbelang, gemeente</i>)	Accorderen transformatieplan	- Accordering TF plan - Start implementatie VG's nieuwe stijl, MDO's, consultatie en uitbreiding FACT+ - Werkwijze spoedverwijzingen	- Werkwijze spoedverwijzingen - Werkwijze VG's, MDO's, transfer-mechanisme, FACT+ - Opstellen plan digitalisering - Inwoners zijn actief betrokken	- Start (of verdere) invoering VG's, MDO's, transfermechanisme, FACT+ - Start implementatieplan digitalisering, prio is bepaald - Inwoners zijn actief betrokken (via bredere werkgroep participatie)

4 Oplossingsrichting 'Versnelling inzet digitale oplossingen': maakt onderdeel uit van het TP

1. Prioritaire opgave - Mentale gezondheid (2^e halfjaar 2025)

Er zijn veel stappen gezet in de uitwerking van ontwikkel- en programma brede opdrachten (denk o.a. aan richtlijnen en samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners). Dit ter voorbereiding van de implementatiefase waarin ervaring kan worden gaan opgedaan in de nieuwe manier van werken (mentaal gezondheidsnetwerk).

	Q3 2025	Q4 2025
1 Preventie en het versterken van de sociale basis (<i>Gemeente, GGD HvB, GGZ Breburg</i>)	• Uitwerken van 3 pijlers project suïcidepreventie (taboe doorbrekende campagne, verbreden gatekeeperstraining, identificeren van kwetsbare doelgroepen) • Ervarensdeskundigen zijn actief betrokken	• Mijlpalen Q4 in de loop van Q3 bepalen • Inwoners zijn actief betrokken
2 Wijkgerichte GGZ (<i>Gemeente, RIBW, GGZ Breburg</i>)	• Vaststellen hernieuwde opdracht laagdrempelige steunpunten • Inwoners zijn actief betrokken	• Start uitvoering • Inwoners zijn actief betrokken
3 Mentaal gezondheidsnetwerk (<i>GGZ Breburg, PrimaCura, Zorgbelang, gemeente</i>)	• Implementatie van pilots, werkwijzen verder invoeren • Verdere uitrol FACT+ • Verder voorbereiden platform digitalisering • Inwoners zijn actief betrokken	• Mijlpalen Q4 in de loop van Q3 bepalen • Inwoners zijn actief betrokken



Samen in beweging

4 *Oplossingsrichting 'Versnelling inzet digitale oplossingen': maakt onderdeel uit van het TP*

1. Prioritaire opgave - Chronische zorgvraag (1^e halfjaar 2025)

Transmurale thuismonitoring

	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025
1 ACP / Samen Beslissen (ZMBR, ETZ)	- Uitvoeren van transmurale werkafspraken en scholing - Uitvoeren doelgroepgerichte aanpak (conf. IZA doelgroepen) - Onze regio is geselecteerd als 3e pilot regio voor IKNL project proactief gegevens delen in de palliatieve fase - Inrichten van een projectstructuur		- IST / SOLL situatie in kaart brengen voor gegevensuitwisseling ihkv pilot - Publiekscampagne Praten over de Toekomst, samenwerking met Thebe Extra: bijeenkomst Udenhout	- Keuze zorgviewer leverancier gemaakt - Starten met bouwen aan IST situatie (viewer) - Publiekscampagne Praten over de Toekomst samenwerking met Thebe Extra: bijeenkomsten Oisterwijk en Tilburg
2 Thuismonitoring (Mijzo, PrimaCura, De Wever, ETZ, Thebe)	- Opstellen visie en blauwdruk voor thuismonitoring in de regio met als voorbeeld uitwerking zorgpad gekozen in Q2 - Organisatie bijeenkomst transmurale thuismonitoring - Expertsessie ETZ en VGZ	- Implementeren thuismonitoring voor zorgpad > inclusie eerste patiënten - Evt. opstellen IZA-TP voor middelen t.b.v. opschaling	Inwoners zijn actief betrokken	- Continuering pilots thuismonitoring binnen eigen organisaties - Verkennen mogelijkheden voor transmurale thuismonitoring - Samenwerken met en aansluiten op RSO agenda – hybride transmurale zorg
3 Ziekenhuis verplaatste zorg (Thebe, ETZ, de Wever)	- Starten pilot Oncolytica thuis - Evalueren AB IV - Starten werkwijze ZH-verplaatste zorg	Toevoegen van zorgpaden en/of middelen (stapsgewijs): Hyperemesis, Dupilumab thuis	Inwoners zijn actief betrokken	Toevoegen van zorgpaden en/of middelen (stapsgewijs): Afkoppelen langdurige chemotherapie

1. Prioritaire opgave - Chronische zorgvraag (2^e halfjaar 2025)

	Q3 2025	Q4 2025
1 ACP / Samen Beslissen (ZMBR, ETZ)	- Bouwen aan IST situatie (viewer) - Verkennd gesprek met Zorgbelang over inwonerparticipatie - Publiekscampagne Praten over de Toekomst: start samenwerking bibliotheek Berkel-Enschot - Publiekscampagne praten over de Toekomst: bijeenkomst Dongen	- Start pilot viewer - Publiekscampagne Praten over de Toekomst: start samenwerking bibliotheek Udenhout - Publiekscampagne Praten over de Toekomst: bijeenkomst Tilburg
2 Thuismonitoring (Mijzo, PrimaCura, De Wever, ETZ, Thebe)	- Verkennd gesprek met Zorgbelang over inwonerparticipatie - Verkennen mogelijkheden voor transmurale thuismonitoring en besluitvorming al dan niet continueren	- Inwoners zijn actief betrokken - Afhankelijk van besluitvorming Q3
3 Ziekenhuis verplaatste zorg (Thebe, de Wever, ETZ)	- Verkennd gesprek met Zorgbelang over inwonerparticipatie - Toevoegen van zorgpaden en/of middelen (stapsgewijs): Aclasta thuis, Natalizumab	- Inwoners zijn actief betrokken - Toevoegen van zorgpaden en/of middelen (stapsgewijs): TWOC, Subcutane injecties Long & KNO



1. Prioritaire opgave - (Kwetsbare) ouderen, nu en straks (1^e halfjaar 2025)

De buurt als ecosysteem: Van onbewust naar meer bewust elkaar weten te vinden. Ondanks obstakels, ervaart iedereen dezelfde urgentie.

	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025
1 Ouderen langer en gezond thuis met een stevig sociaal netwerk; project 'De buurt als ecosysteem voor maatschappelijke gezondheidszorg' (<i>Thebe, CdT, PrimaCura, gemeenten, burgerorganisaties</i>) <i>Rij 1 = Goirle</i> <i>Rij 2 = Groenewoud</i>	- Aanvraag uitwerken en afstemming zorgverzekeraars - Lokale samenwerking opzetten	Opstellen buurtbeeld, buurtplan, buurtbegroting	- Opstellen buurtbeeld, buurtplan, buurtbegroting - Verder uitwerken van de beide buurtplannen i.s.m. alle aangesloten partners en burgers - Voorbereiding van de 1^e activiteiten in de twee wijken - Start gezamenlijke scholing - Inwoners zijn actief betrokken	- Gezamenlijke uitvoering van de eerste activiteiten - Inwoners zijn actief betrokken (seniorenraad) - Seniorenraad: denktank in ontwikkeling voor cliënten die zkh verlaten
	- Aanvraag uitwerken en afstemming zorgverzekeraars - Lokale samenwerking opzetten	Opstellen buurtbeeld, buurtplan, buurtbegroting	- Opstellen buurtbeeld, buurtplan, buurtbegroting - Verder uitwerken van de beide buurtplannen i.s.m. alle aangesloten partners en burgers - Voorbereiding van de 1^e activiteiten in de twee wijken - Start gezamenlijke scholing - Inwoners zijn actief betrokken	- Gezamenlijke uitvoering van de eerste activiteiten - Uitvraag studenten Avans onder wijkbewoners - Organisatie 1^e vitaliteitsdag - Start zoete pauze (moment voor mantelzorgers om samen en met casemanager te sparren)
	Oplevering sprint 1 Zwachtelen	- Besluit genomen om dit te realiseren los van IZA-toekenning - Start sprint 2 Wassen	- Oplevering sprint 2 Wassen - Start sprint 3 Uitvoeringsverzoek - Inwoners zijn actief betrokken	- Oplevering sprint 3 Uitvoeringsverzoek - Opschaling steunkousen naar ETZ - Doorontwikkeling klantreis zwachtelen naar wonden - Bij iedere klantreis wordt input opgehaald bij inwoners
	- Vooronderzoek en ontwerpfase - Opstellen van de IZA-aanvraag - Afstemming en aansluiting ketenpartners	Indienen IZA-aanvraag (wordt Q1 2025)	- Indienen IZA-aanvraag - Bestuurlijk besluit over IZA-traject - Besluitvorming over het ontwerp en start pilot - Voorbereiding pilot Aanmeldportaal wijkverpleging - Inwoners zijn actief betrokken	2e versie IZA-aanvraag ingediend - Fase 2 voorbereiding en ontwikkeling tool gestart (digitale tool, werkafspraken binnen schakelteams, leren van andere regio's) - Cliënten zijn actief betrokken (0-meting)
2 Zelfstandig wonen met passende zorg en ondersteuning (<i>Sprint Bevorderen Zelfredzaamheid VVT-aanbieders, per Sprint-onderwerp relevante samenwerkingspartners</i>)				
3 Integraal capaciteitsmanagement/ zorgcoördinatie; project aanmeldportaal wijkverpleging (<i>Mijzo, De Wever, Thebe, PrimaCura, ETZ</i>)				

1. (Kwetsbare) ouderen, nu en straks (2^e halfjaar 2025)

De buurt als ecosysteem: we zetten koers naar echte verandering.

	Q3 2025	Q4 2025
1 Ouderen langer en gezond thuis met een stevig sociaal netwerk; project 'De buurt als ecosysteem voor maatschappelijke gezondheidszorg' (<i>Thebe, CdT, PrimaCura, gemeenten, burgerorganisaties</i>) <i>Rij 1 = Goirle</i> <i>Rij 2 = Groenewoud</i>	- Alle partijen hebben overeenstemming en weten met welke visie ze verder gaan werken - Contacten behouden en onderhouden - Verder uitbouwen van al gestarte initiatieven - Inwoners zijn actief betrokken	- Mijlpalen Q4 in de loop van Q3 bepalen - Inwoners zijn actief betrokken
	- Alle partijen hebben overeenstemming en weten met welke visie ze verder gaan werken - Contacten behouden en onderhouden - Verder uitbouwen van al gestarte initiatieven - Inwoners zijn actief betrokken	- Mijlpalen Q4 in de loop van Q3 bepalen - Inwoners zijn actief betrokken
2 Zelfstandig wonen met passende zorg en ondersteuning (<i>Sprint Bevorderen Zelfredzaamheid VVT-aanbieders, per Sprint-onderwerp relevante samenwerkingspartners</i>)	- Keuze maken m.b.t. Transformatieplan Sprints - Evaluatie opleveren sprint zwachtelen - Opschaling sprints naar revalidatie en ziekenhuizen - Borging reeds ontwikkelde sprints binnen de organisaties - Inwoners zijn actief betrokken	- Verkenning thema sprint 4 - Borging sprints via aanjagers en managers - Inwoners zijn actief betrokken (n.v.t.; er wordt in Q4 geen klantreis gestart)
	- Focus op communicatie/ stakeholdermanagement met een externe adviseur - voorbereiding inrichting website aanmelding wijkverpleging die toegankelijk voor cliënten is - Cliënten zijn actief betrokken	- Verdere implementatie - Cliënten zijn actief betrokken
3 Integraal capaciteitsmanagement/ zorgcoördinatie; project Aanmeldportaal Wijkverpleging (<i>Mijzo, De Wever, Thebe, PrimaCura, ETZ</i>)		



Sprints Zwachtelen met beenwonden en Uitvoeringsverzoek



Hoofdstuk 2
**Integrale oplossings-
richtingen**

2. Integrale oplossingsrichtingen

Integrale oplossingsrichtingen



Preventie en zelf-/samenredzaamheid



Zorgzame en gezonde buurt



Juiste zorg op de juiste plek



Digitalisering en hybride ondersteuning en zorg



Een gedrags- en cultuurverandering

Borging oplossingsrichtingen

Preventie en zelf-/samenredzaamheid wordt binnen elk van de vijf prioritaire opgaven geborgd binnen minimaal één oplossingsrichting (bijv. "preventie en versterken van sociale basis" binnen "mentale gezondheid"). En het is de basis voor onze regionale, (ketenbrede) aanpak versterken zelfredzaamheid. In 2025 stellen we, aanvullend, een Plan van Aanpak op om deze aanpak verder uit te rollen in onze regio en verder te verbinden aan de prioritaire opgaven.


De voortgang op deze oplossingsrichting is nader toegelicht op pagina 16.

Binnen de uitwerkingen van de oplossingsrichtingen van mentale gezondheid, chronische zorgvraag en (kwetsbare) ouderen, nu en straks is nadrukkelijk aandacht voor JZOJP

De Eerste snelle toets ingediend door RSO Midden-Brabant is goedgekeurd, het indienen van het Transformatieplan heeft vertraging opgelopen. Doel is om door middel van een viewer te komen tot realisatie van (primaire) gegevensuitwisseling tussen professionals over de domeinen heen. Vanuit de prioritaire opgaven is inzichtelijk gemaakt welke digitaliseringsvraagstukken er liggen. Dit is verwerkt in een handreiking en besproken met RSO Midden-Brabant. Het eerste contact is gelegd tussen RSO en de prioritaire opgaven (TP mentale gezondheid). Aandacht wordt gevraagd voor het sociaal domein binnen deze oplossingsrichting.

Een gedrags- en cultuurverandering is nodig om regionale transitie te realiseren, maar is in opgave-specifieke oplossingsrichtingen nog onvoldoende geëxpliciteerd. In 2025 geven we een impuls aan deze oplossingsrichting, primair gekoppeld aan onze communicatiestrategie en implementatie van het Plan van Aanpak inwonerparticipatie. En aansluitend op de initiatieven die al bij de diverse organisaties lopen. Ook starten we als Kernteam met de ontwikkeling van een gezamenlijke leerproces.

2. Integrale oplossingsrichting – Zorgzame en gezonde buurten (1^e halfjaar 2025)

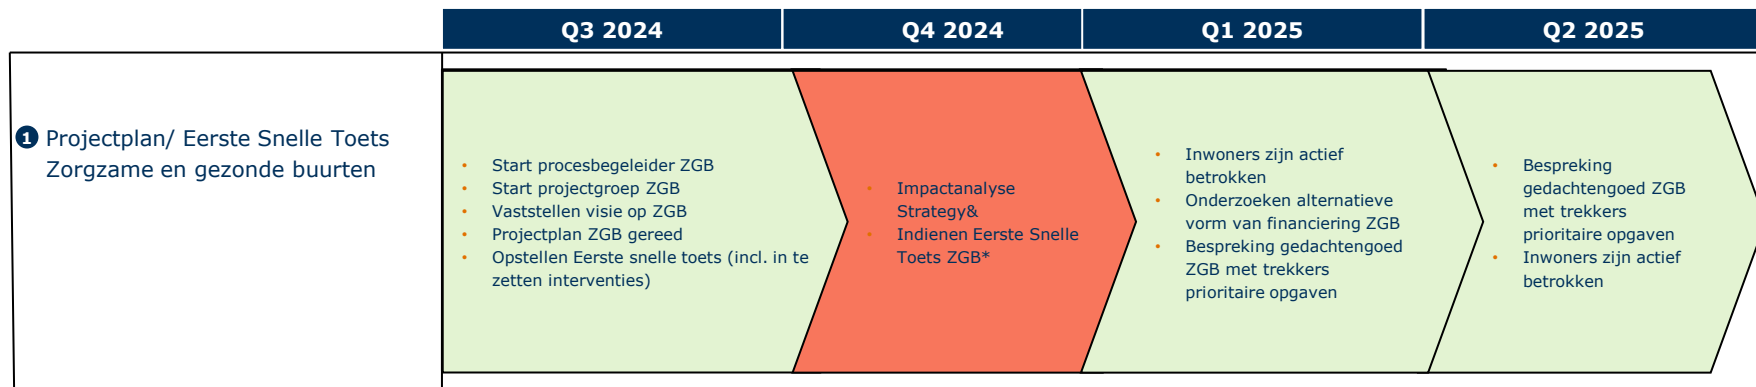

** De impactanalyse wees uit dat ZGB onvoldoende impact heeft op de ZVW (wel op sociaal domein en Wlz). De Eerste Snelle Toets is niet ingediend.*

2. Integrale oplossingsrichting – Zorgzame en gezonde buurten (2^e halfjaar 2025)

	Q3 2025	Q4 2025
1 Projectplan Zorgzame en gezonde buurten	- Start Zorgzame en gezonde buurten in Oisterwijk - Follow up gesprek met kartrekkers - Inwoners zijn actief betrokken	- Voortgang Zorgzame en gezonde buurten Oisterwijk - Follow up gesprek met kartrekkers - Inwoners zijn actief betrokken



Praatplaat Zorgzame en Gezonde Buurten



Hoofdstuk 3
Inwonerparticipatie

3. Inwonerparticipatie (1^e halfjaar 2025)


In de eerste helft van 2025 hebben we stappen gezet richting meer inwonerparticipatie binnen IZA Midden-Brabant. Hoewel de voortgang langzaam is, zien we dit als een kans om te verbeteren.

	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025
1 Plan van Aanpak Inwonerparticipatie Midden-Brabant (looptijd aug.-dec. 2024)	- Inventarisatie participatie met kartrekkers prioritaire opgaven - Opstellen Plan van Aanpak aug.-dec. 2024	- Vaststelling Plan van Aanpak aug.-dec. 2024 - Voorstel participatie inwoners binnen de regio (i.s.m. initiatiefgroep)	Plan van Aanpak 2025 opstellen o.b.v. notitie 'Betrekken inwoners Midden-Brabant'	- Plan van Aanpak vaststellen - Start implementatie Plan van Aanpak
2 Participatie in opgaven Regioplan	- Advisering bij regionale ketenaanpak Kansrijke Start - Organisatie inwonerparticipatie t.b.v. TP Zorgzame en gezonde buurten (focusgroep en digitale vragenlijst) - Deelname projectgroep Toegankelijke mentale gezondheids-netwerken - Deelname projectgroep Zorgzame en gezonde buurten - Deelname WG communicatie	- Start werkgroepen TP Toegankelijke mentale gezondheidsnetwerken (WG inwoner-participatie en communicatie) - Deelname projectgroep Zorgzame en gezonde buurten - Deelname WG communicatie	- Deelname aan TP Toegankelijke mentale gezondheidsnetwerken - Afstemming met kartrekkers en projectleiders binnen de prioritaire opgaven over inzet inwonerparticipatie - Deelname werkgroep communicatie	- Deelname aan TP Toegankelijke mentale gezondheidsnetwerken - Afstemming met kartrekkers en projectleiders binnen de prioritaire opgaven over inzet inwonerparticipatie - Deelname werkgroep communicatie

3. Inwonerparticipatie (2^e halfjaar 2025)

In de tweede helft van 2025 organiseren we een masterclass om participatie beter te integreren in de prioritaire opgaven en projecten. Ook zetten we in op het vertellen van ervaringen van inwoners (als lid werkgroep communicatie en medeorganisator van de talkshow). Zorgbelang biedt advies en ondersteuning aan de kartrekkers en projectleiders.

	Q3 2025	Q4 2025
1 Plan van Aanpak Inwonerparticipatie Midden-Brabant (looptijd 2025)	- Ontwikkeling visie op participatie - Vorbereiding Talkshow - Uitvoering Plan van aanpak Inwonersparticipatie	- Masterclass participatie - Talkshow - Uitvoering Plan van aanpak Inwonersparticipatie
2 Participatie in opgaven Regioplan	- Deelname aan TP Toegankelijke mentale gezondheidsnetwerken - Afstemming met kartrekkers en projectleiders binnen de prioritaire opgaven over inzet inwonerparticipatie - Deelname werkgroep communicatie	- Deelname aan TP Toegankelijke mentale gezondheidsnetwerken - Afstemming met kartrekkers en projectleiders binnen de prioritaire opgaven over inzet inwonerparticipatie - Deelname werkgroep communicatie

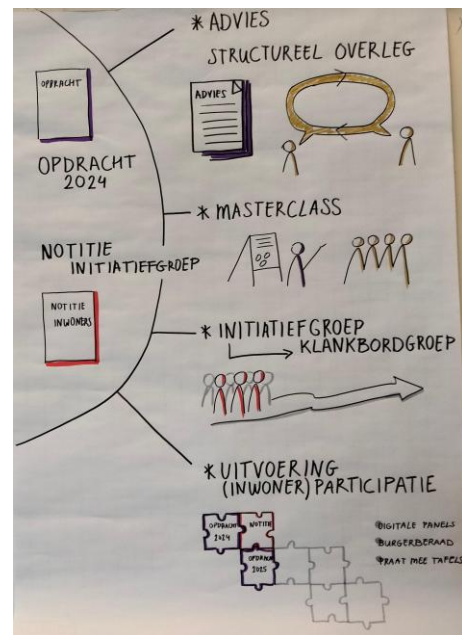

Plan van Aanpak 2025



Hoofdstuk 4
Communicatie

4. Communicatie (1^e halfjaar 2025)

Tussen oktober 2024 en juni 2025 heeft de IZA communicatiewerkgroep de strategie van 2024 verder uitgewerkt en verdiept. Zo kon in Q2 (juni 2025) een stevig fundament voor de uitvoering van de communicatie worden gepresenteerd in het bestuurlijk IZA-overleg, inclusief een herkenbare hashtag: #SamenGezondVooruit. Het bestuur gaf op de uitgewerkte strategie en de hashtag akkoord.

	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025
1 Communicatieplan IZA Midden-Brabant (de beweging, gedrags- en cultuurverandering)	- Start werkgroep communicatie (vertegenwoordiging namens alle organisaties) - Opstellen communicatieplan	- Vaststellen communicatieplan (incl. doelgroep) - Opstellen Kernboodschap - Brainstorm #naam - Opstellen content- en activiteitenkalender - Opstellen bewustwordingscampagne	- Vaststellen #naam - Vaststellen kernboodschap - Vaststellen bewustwordingscampagne	Lancering bewustwordingscampagne
2 Projectcommunicatie IZA - nieuwsbrief	- Opstellen en verzenden IZA nieuwsbrief 2 - Opstellen communicatieplan	- Opstellen en verzenden IZA nieuwsbrief 3 - Offerte comm.bureau opstellen praatplaat (nieuwsbrief "2.0") - Nieuwsbericht VNG resolutie uitgestuurd	Opstellen en verzenden IZA nieuwsbrief 4	Opstellen en verzenden IZA nieuwsbrief 5
3 Projectcommunicatie IZA – faciliteren bijeenkomsten	Bestuurlijke regioalliantie (3-7)	- Tactische regioalliantie (7-11) - Digitale informatiebijeenkomst IZA zorg (20-11)		- Raadsbijeenkomst HVB gemeenten - Tact. regioalliantie (3-4) - Digitale info. bijeenkomsten IZA (15-4 en 17-6) - Best. regioalliantie (15-5)

4. Communicatie (2^e halfjaar 2025)

Met de geaccordeerde communicatiestrategie in Q2 gaat de communicatiewerkgroep het tweede half jaar van 2025 concreet aan de slag. Onze stip op de 2025-horizon is een zichtbare uitwerking van de strategie in middelen die we inzetten: een vormgegeven hashtag, een basis-toolkit, toekomstmakers en concreet vormgegeven verhalen over en met zorgprofessionals die in hun dagelijks werk de beweging naar gezondheid, welzijn en preventie bij inwoners, cliënten en patiënten ondersteunen.

	Q3 2025	Q4 2025
1 Communicatieplan IZA Midden-Brabant	• Ontwikkelen toolkit (inclusief look & feel #) • Werven toekomstmakers (ambassadeurs) • Start ophalen verhalen, eerste conceptversies opstellen	• Start implementatie bewustwordingscampagne
2 Nieuwsbrief IZA	• Opstellen en verzenden nieuwsbrief 6 • Ontwikkelen nieuwe stijl nieuwsbrief	• Opstellen en verzenden nieuwsbrief 7
3 Faciliteren bijeenkomsten	• Voorbereiding tafelgesprek VWS	• Tafelgesprek VWS • Bestuurlijke regioalliantie (30-10) • Tactische regioalliantie (4-11) • Digitale info. bijeenkomst IZA (20-11)




'Toegankelijke mentale gezondheidszorg voor onze inwoners'
(Tactische regioalliantie, 3-4)



Hoofdstuk 5
Beleidsmonitoring

5. Beleidsmonitor (1^e halfjaar 2025)

Met de beleidsmonitor brengen we informatie bij elkaar om de impact die we willen maken te kunnen meten en met elkaar het gesprek te voeren over de weg die we met elkaar ingeslagen zijn.

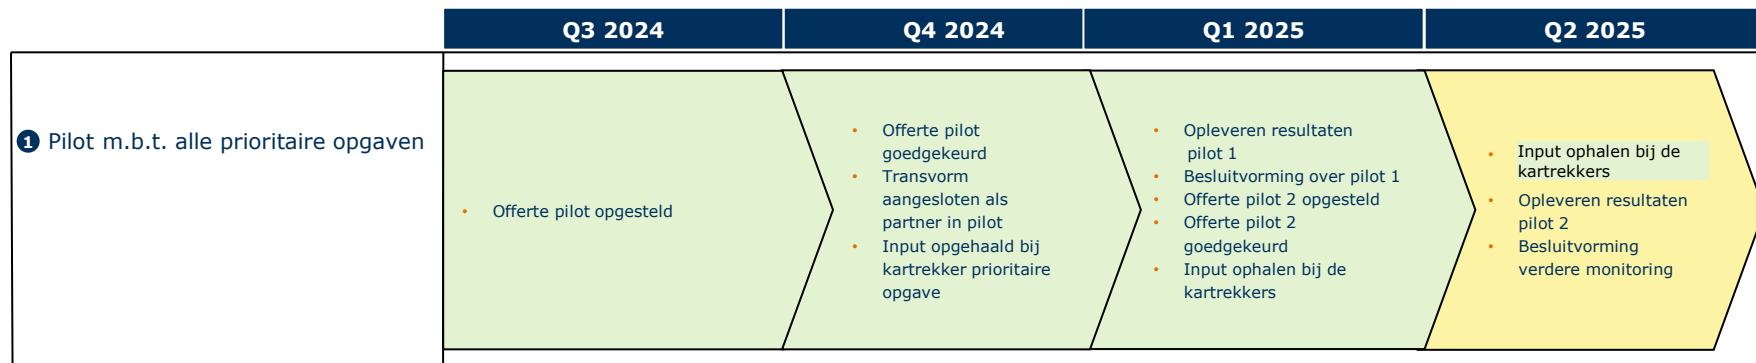

5. Beleidsmonitoring (2^e halfjaar 2025)

	Q3 2025	Q4 2025
1 Pilot m.b.t. alle prioritaire opgaven	• Opleveren resultaten pilot 2 • Besluitvorming verdere monitoring	• Invulling mijlpalen Q4 afhankelijk van besluitvorming in Q3

